




## Jaarrapportage 2009

# Uitvoering Natura 2000-beheerplan Voordelta

28 april 2010

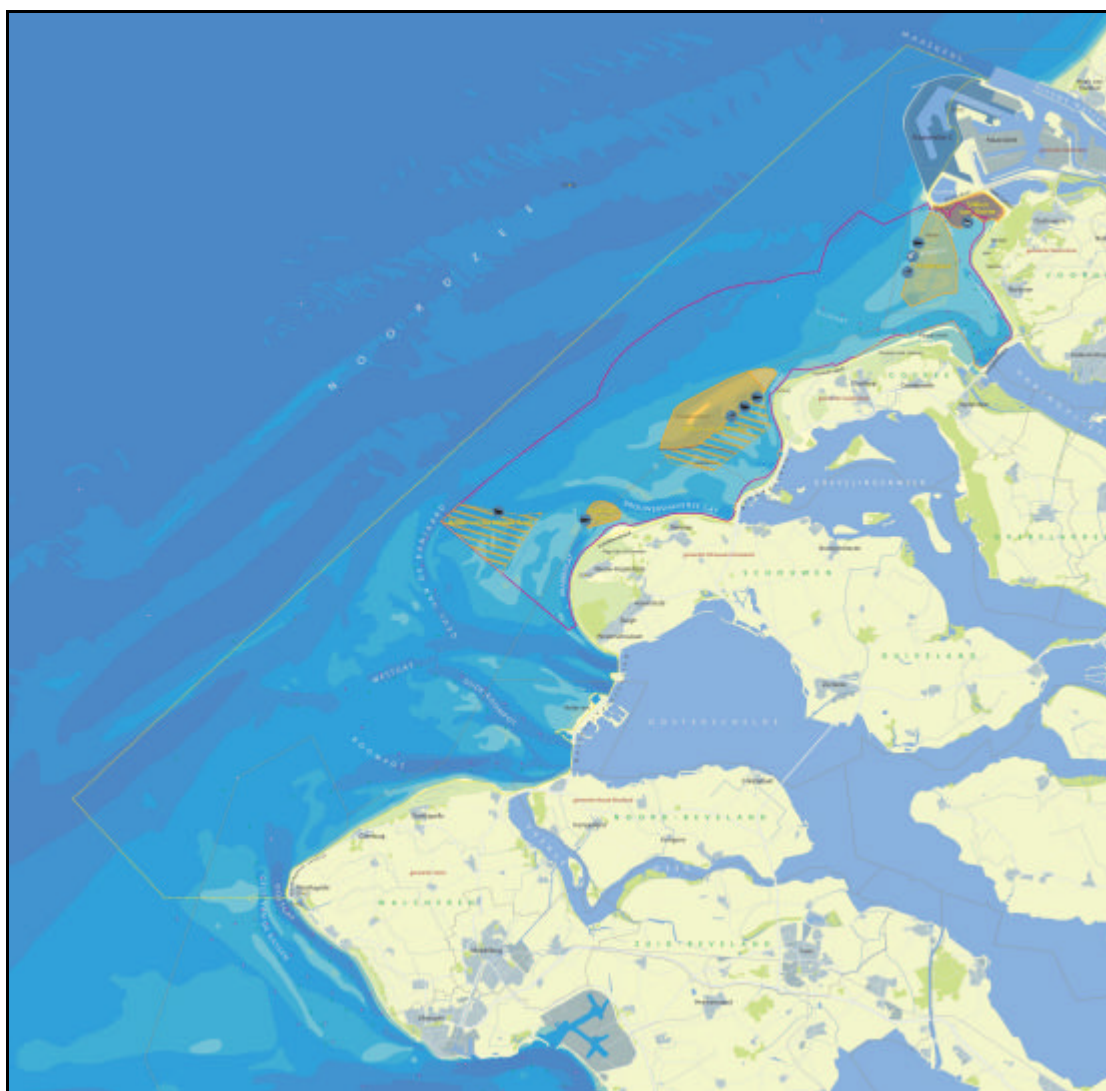

## 1 Doel en aanleiding

Voorliggende jaarrapportage bevat de resultaten op productniveau van de uitvoering in het jaar 2009 van het Natura 2000-beheerplan Voordelta. In juli 2008 is het Natura 2000-beheerplan Voordelta vastgesteld door het bevoegd gezag. Op 16 juli 2008 heeft het bevoegd gezag ingestemd met het "Uitvoeringsprogramma beheerplan Voordelta" (Twiynstra Gudde, 2 juli 2008), de financiering in het startjaar en de jaarlijkse kostenverdeling. De uitvoering van het beheerplan is direct daarna gestart. Het jaar 2009 was het eerste volle uitvoeringsjaar. Het beheerplan heeft een looptijd tot medio 2014. De uitvoering van het beheerplan is uitgesplitst in vijf thema's, met per thema een coördinator: Toezicht en Handhaving (provincie Zuid-Holland), Communicatie (provincie Zeeland), Markeren (Rijkswaterstaat), Monitoren (Rijkswaterstaat), Vergunningverlening (provincie Zeeland). Het rijk (i.c. Rijkswaterstaat) neemt de overall coördinatietoek op zich.

## 2 Uitvoering Voordelta algemeen

De dagelijkse uitvoering van het Natura 2000-beheerplan Voordelta wordt aangestuurd door de Regiegroep (deelnemers zie bijlage 1). De Regiegroep is 4 keer bijeengewees voor overleg. Tussendoor verliep het "dagelijkse" contact per mail en telefonisch. De aansturing van het werk gebeurt vanuit de vastgestelde producten en mijlpalen (zie onder, punt 3). Het Bevoegd Gezag Overleg (feitelijk de stuurgroep boven de Regiegroep) hoefde niet bijeen te komen in 2009. De belangrijkste besluiten konden worden afgedaan per brief, voorbereid door de Regiegroep. De start van de uitvoering is officieel gevierd op 2 maart te Ouddorp in aanwezigheid van de Staatssecretaris van V&W, overheidsbestuurders en bestuursleden van belangenorganisaties. Op deze feestelijke happening is tevens de gedragscode Voordelta op een ludieke manier onthuld en onderschreven door 32 partijen (overheden en belangenorganisaties). Op 16 december heeft de Raad van State alle (zeven stuks) nog bij haar in behandeling zijnde beroepen tegen Natura 2000-beheerplan Voordelta ongegrond verklaard. Dankzij die uitspraak is het beheerplan onherroepelijk geworden.

## 3 Uitvoering producten Voordelta 2009

### 3.1 Toezicht en Handhaving (coördinatie: provincie Zuid-Holland)

De Kerngroep Handhaving Voordelta heeft de handhavingsactiviteiten die in 2009 in de Voordelta hebben plaatsgevonden, geëvalueerd. Daarbij is beoordeeld of aan de gestelde handhavingsdoelstellingen is voldaan en is kritisch gekeken naar het uitvoeringsproces. De bevindingen zijn neergelegd in de Jaarrapportage Handhaving Voordelta 2009.

In totaal zijn er 185 controles uitgevoerd vanaf het land en op zee. Tezamen met de waarnemingen vanuit de post Ouddorp heeft dit geresulteerd in 729 geconstateerde overtredingen. Het merendeel van de overtredingen is begaan door kitesurfers (322), wandelaars (114), recreatievaart (109) en windsurfers (108). Met enige voorzichtigheid kan uit de verzamelde data worden afgeleid welke overtredingen zich in welk rustgebied het meest hebben voorgedaan (zie onderstaande tabel):

<b>Activiteit</b>	<b>Gebied(en)</b>
<b>Kitesurfen</b>	Slikken van Voorne, Hinderplaat, Bollen van de Ooster
<b>Wandelen (met honden)</b>	Slikken van Voorne en Verklipperplaat
<b>Recreatievaart</b>	Bollen van de Ooster, Hinderplaat
<b>Paardrijden</b>	Slikken van Voorne
<b>Motorrijden</b>	Slikken van Voorne
<b>Windsurfen</b>	Bollen van de Ooster
<b>Beroepsvisserij</b>	Bollen van het Nieuwe Zand

Vooral de kitesurfers ter plaatse van de Slikken van Voorne behoeven in 2010 extra aandacht. Tot september 2009 is conform afspraak niet of nauwelijks verbaliserend opgetreden (met uitzondering van excessen), maar heeft de nadruk gelegen op voorlichting en zijn waarschuwingen uitgedeeld (waarbij overigens wel de personalia zijn opgenomen). Over heel 2009 zijn desondanks 52 processen-verbaal opgemaakt.

De Kerngroep Handhaving Voordelta is in 2009 vier keer bij elkaar geweest. Het Platform Handhaving Voordelta, met daarin alle betrokken handhavingpartners, tweemaal. Voor de besproken onderwerpen wordt korthedshalve verwezen naar de Jaarrapportage Handhaving Voordelta 2009.

Uit de evaluatie zijn de volgende aandachtspunten naar voren gekomen:

- Het plaatsen van de informatieborden is essentieel voor een goed naleefgedrag; met name op de locaties waar kitesurfers actief zijn (actie provincie Zeeland).
- De herkenbaarheid van de begrenzing van het rustgebied Bollen van de Ooster kan beter; betoning optimaliseren (actie Rijkswaterstaat).
- Follow-up van de meldingen die binnenkomen bij het centraal meldpunt (milieutelefoon provincie Zuid-Holland) is praktisch moeilijk te realiseren; bekijken welke alternatieven daarvoor zijn (actie provincie Zuid-Holland).
- De registratie van de toezicht- en handhavingsinspanningen in het Boaregistratiesysteem door de diverse handhavingpartners moet meer uniform zijn (actie provincie Zuid-Holland).
- Toezicht en handhaving op de visserij is – mede door vertraging in de uitrol van de AIS-transponders en implementatie van het protocol meldingen op het Kustwachtcentrum – een onderbelicht onderwerp geweest. Risico's t.a.v. naleefgedrag door de visserij zijn voor 2009 geaccepteerd.

De bevindingen uit de evaluatie dienen als input voor de actualisatie van het Handhavingsplan Voordelta en het uitvoeringsprogramma 2010.

**Tabel: producten en mijlpalen Toezicht en Handhaving Voordelta 2009:**

Product nr.	Omschrijving	Mijlpaal	Resultaat
<b>1</b>	<b>Coördinatie en regie</b>		
1.1	Rooster gezamenlijke opstap-/meerijddiensten instanties	April	Het rooster is opgesteld en gedurende 2009 maandelijks geactualiseerd en toegezonden aan alle handhavingpartners (doorlopend proces).
1.2	Gedragscode overheden en toezichthoudende instanties opstellen en uitdragen.	Juni	De gedragscode is opgesteld en uitgedragen aan de betrokken instanties. In 2010 en verder zal hier aandacht voor blijven.
1.3	Protocol (draaiboek) meldingen.	juli	Er is een voorlopig protocol opgesteld, waarbij onderscheid gemaakt wordt naar de aard van de overtredingen en de benodigde follow-up. Dat wordt in 2010 verder uitgewerkt.
1.4	Ontwikkeling standaard proces-verbaal (pv.).	Juni	Prov. Z-H heeft, samen met Zeehavenpolitie en politie Rotterdam-Rijnmond een standaard-pv ontwikkeld en voorgelegd aan de FP's van Amsterdam (kustwater) en Rotterdam. Het standaard pv is in 2010 reeds gebruikt door de handhavingpartners.

Product nr.	Omschrijving	Mijlpaal	Resultaat
1.5	Sanctiestrategie i.v.m. strafrechtelijk optreden.	Oktober	Vanaf 1 september 2009 wordt de landelijke sanctiestrategie gevolgd ingeval van betredingen (aflopende delicten). Voor overtredingen van vergunningvoorwaarden wordt de nieuwe sanctiestrategie gevolgd, ontwikkeld door PZH, DCMR en FP. Dit wordt betrokken bij de actualisering van het Handhavingsplan Voordelta, zie punt 1.6.
1.6	Actualisering Handhavingsplan 2010.	December	Het handhavingsplan Voordelta wordt aangepast aan de nieuwe sanctiestrategie en aan de ervaringen van 2009. Deze nieuwe versie moet een aantal jaren meegaan. Jaarlijkse bijsturing gaat vervolgens via het uitvoeringsprogramma. Planning: PZH - maart 2010.
1.7	Opleiding en organisatie bijeenkomsten (Platform Toezichthouders).	Mei; Oktober	Gerealiseerd. Cursussen BOA-registratiesysteem in het voorjaar 2009 en de Platformdagen op 28 mei en 3 december 2009.
<b>2</b>	<b>Toezicht op land en water</b>		
2.1	Provinciaal toezicht op zee en land.		Zie jaarrapportage Handhaving Voordelta 2009.
2.2	Objectgebonden toezicht.		Zie jaarrapportage Handhaving Voordelta 2009.
2.3	Administratief-juridische afhandelingen.		Zie jaarrapportage Handhaving Voordelta 2009.
2.4	Subsidiering AIS-transponders visserijvloot.	Juli December	Publicatie van de subsidieregeling heeft op 15 juni in de Staatscourant plaatsgevonden. De subsidieregeling is eenmalig en geldt alleen voor het jaar 2009. Er zijn 134 transponders geplaatst onder deze subsidieregeling.
3	Exploitatie, materieel provinciale vaar- en voertuigen.		De snelle rubberboten van PZH en ZHP (Zeehavenpolitie) hebben beide ligplaats bij het steunpunt van RWS Haringvliet in Stellendam. Het ms Branta van PZId heeft ligplaats in Kats (Oosterschelde).

#### Financiën:

Bovenstaande activiteiten zijn uitgevoerd voor de totaal som van EURO 674.000

### 3.2 Communicatie (coördinatie: provincie Zeeland)

In 2009 heeft een verdere uitwerking van de communicatiestrategie plaats gevonden. Hierbij is met name aandacht besteed aan de per doelgroep gewenste en noodzakelijk communicatie. Verschillende doelgroepen verlangen immers ieder hun eigen benadering, met de daarbij behorende middelen. Zo is met de Nederlandse Kitesurfvereniging afzonderlijk gesproken over het ontwikkelen van specifiek voor de doelgroep bedoeld informatiemateriaal. De werkgroep communicatie heeft zich met name gericht op de actualisering van de communicatiemiddelen, de ontwikkeling van de huisstijl en bebording en de opzet van de website (zie onder).

De in 2008 uitgebrachte folder is in 2009 geactualiseerd en in een oplage van 40.000 (Nederlands) en 30.000 (Duits) herdrukt. De verspreiding gedurende het jaar is voor het Zeeuwse deel van de Voordelta geoptimaliseerd. Voor het Zuid-Hollandse deel wordt hier nog aan gewerkt. Eind 2009 heeft opnieuw een actualisatie en herdruk plaats gevonden (20.000 Nederlandse en 10.000 Duitse).

De website [www.voordelta.nl](http://www.voordelta.nl) is in 2009 opgebouwd en in een testomgeving geplaatst. Door verschillende partners is toegezegd mee te draaien in de testomgeving. Met hun commentaar kan de website vervolmaakt worden. De gedragscode Voordelta is begin 2009 gereedgekomen, na een intensief afstemmingsproces met de 32 organisaties die deze hebben onderschreven. De gedragscode is tijdens een feestelijke bijeenkomst in Ouddorp op 2 maart 2009, waarbij alle ondertekenaars waren uitgenodigd, in aanwezigheid van de staatssecretaris van V&W gepresenteerd. De gedragscode is uitgebracht op posterformaat. Tevens is de gedragscode verwerkt in andere ontwikkelde communicatiemiddelen (o.a. in genoemde folders, enkele tienduizenden bierviltjes, die verspreid zijn op campings en in strandtenten) en tevens in twee VVV-gidsen (Ouddorp, Schouwen-Duiveland).

Het ontwikkelen van de bebording voor de strandovergangen heeft in 2009 veel tijd en energie gevraagd. Er is veelvuldig overlegd met als doel er voor te zorgen dat op de in overleg met de gemeenten ontworpen borden per bord de juiste informatie beschikbaar kwam. Ieder bord is hierbij uniek voor de betreffende locatie. Ook is er afstemming gezocht met lopende landelijk projecten op het gebied van strandbebording. Zo zijn teksten en pictogrammen afgestemd met de KNRM en de landelijk campagne "Houd uw strand en de natuur schoon!". Het noodzakelijke overleg en het zoeken naar afstemming heeft vertragend gewerkt op de productie en levering van de bebording, zodat dit project doorloopt tot in 2010.

Op verzoek van de handhavers zijn in zomer 2009 speciale informatieborden geplaatst bij een 3-tal trailerhellingen (Neeltje Jans, Brouwersdam en Buitenhaven Stellendam).

Naast de hierboven beschreven activiteiten zijn er vanuit de handhaving zowel intern als extern volop communicatiemomenten aan de orde geweest. Zo hebben de diverse handhavingspartners in de Voordelta in 2009 met elkaar ruim 2000 Voordelta folders uitgereikt aan overtreders en aan andere recreanten en bezoekers. In veel gevallen hebben ze daarbij uitleg gegeven over de status van het gebied. De kitesurfscholen en instructeurs zijn individueel benaderd, wat heeft geresulteerd in een goede sociale controle en een goed naleefgedrag van de leerlingen.

In verschillende tijdschriften is aandacht besteed aan het beheerplan Voordelta, onder meer in het periodiek van Het Zuid-Hollands Landschap en in de Kust- en Zeegids.

Presentaties over (delen van) de uitvoering van het beheerplan Voordelta zijn gehouden tijdens de vergadering van de werkgroep communicatie, het MOV, het Actualiteitencongres Natura 2000 van het Studiecentrum Bedrijf en Overheid op 15 oktober 2009, de Nationale Kustdagen, die op 26 en 27 november 2009 in Rockanje, grenzend aan de Slikken van Voorne, werden gehouden, op de LOM-contactdag op 19 november 2009 en tijdens de Platformdag Handhaving Voordelta op 3 december 2009. Voor de presentaties is een format in de huisstijl ontwikkeld.

Vanuit de gezamenlijke bevoegde gezagen zijn een 2-tal persberichten verstuurd: over het aanbrengen van de voorjaarsbetonning (zomerregime) en over de uitspraak van de Raad van State over de beroepen tegen het beheerplan.

In juni 2009 is breed overleg gevoerd met de maatschappelijke organisaties in de Voordelta (MOV). Tijdens dit MOV is gediscussieerd over de communicatie en zijn suggesties aangereikt voor de verdere invulling van de communicatie. Te denken valt aan het ontwikkelen van een specifieke natuurfolder, placemats met Voordelta info en het opzetten van een cursus gastheerschap voor ondernemers op het gebied van recreatie en toerisme. Met een dergelijke cursus, naar voorbeeld van een dergelijke succesvolle cursus georganiseerd door het Nationaal Park Oosterschelde, wordt een doorgeefluik gecreëerd naar gebruikers toe.

In het MOV is de Subsidieregeling Stimulering Voordelta toegelicht. Informatie over deze subsidieregeling en over de gehonoreerde initiatieven wordt verstrekt

via de website van de provincie Zeeland, die de regeling uitvoert (<http://loket.zeeland.nl/subsidies/voordelta/>).

Met de leden van het MOV is afgesproken om in principe 1 maal per jaar bijeen te komen.

**Tabel: producten en mijlpalen Communicatie Voordelta 2009:**

Product nr.	Omschrijving	Mijlpaal	Resultaat
1	Opstellen communicatieplan.	Oktober	Eerste aanzet opgeleverd. Doelgroepspecifieke communicatie is verkend, maar moet nog verder uitgewerkt worden.
2	Organiseren MOV	Juni	MOV in juni plaats gevonden.
3	Herdruk + verspreiding folder.	Mei, juli	Geactualiseerde herdruk is verspreid.
3	Herdruk + verspreiding gedragscode.	Maart	De gedragscode is 2 maart 2009 feestelijk gepresenteerd. Verspreiding is permanente activiteit. Doorwerking code in folder en website.
4	Ontwerp + opbouw website ( <a href="http://www.voordelta.nl">www.voordelta.nl</a> ).	Juli	De website is opgebouwd, vormgegeven in de Voordelta huisstijl en stond eind 2009 in de testomgeving.
5	Ontwikkeling + verspreiding nieuw voorlichtingsmateriaal.	December	Eerste ideeën zijn ontwikkeld, maar nog niet concreet uitgewerkt.
6	Leveren redactionele bijdragen diverse media.	December	Heeft in 2009 onvoldoende aandacht gekregen. Schuift door naar 2010.
7	Ontwikkeling, oplevering en plaatsing bebording strandopgangen.	Oktober	Ontwerpen en vormgeving bebording afgerond, productie eind 2009 in gang gezet.

**Financiën:**

Bovenstaande activiteiten zijn uitgevoerd voor de totaalsom van EURO 75.000.

**3.3 Markeren (coördinatie Rijkswaterstaat Noordzee)**

Het markeringsplan (2008) is uitgevoerd en in 2009 zijn alle markeringen gepubliceerd op de Hydrografische kaarten en Waterkaarten van resp. de Hydrografische Dienst en de ANWB. De betonning heeft het eerste stormseizoen (w.o. pieken met windkracht 10) goed doorstaan. De jaarlijkse inspectie en het onderhoud van alle objecten is tevens uitgevoerd. Het verplaatsen van de betonning in voor- en najaar (vastgelegde seizoenscyclus) is uitgevoerd conform afspraken; aandachtspunt voor het vervolg is een meer tijdige communicatie met de doelgroepen. Het plaatsen van bebording (in plaats van de geplande markeringspaal) op de grens van de Verklikkerplaat door de provincie Zeeland is doorgeschoven naar 2010.

De evaluatie van ligging en effectiviteit van markeringen is uitgevoerd op grond van ervaringen vanuit de Markeringsdienst van Rijkswaterstaat Noordzee, de toezichthouders en handhavers (Platform) en ervaringen van enkele belangenorganisaties. Uitvoering van verschillende aanpassingen (vervangen enkele tonnen door een ander type ton op strategische punten) zijn gepland voor 2010.

**Tabel: producten en mijlpalen Markeren Voordelta 2009:**

Product nr.	Omschrijving	Mijlpaal	Resultaat
1	Uitvoering markeringsplan (betonning, palen).	Doorlopend, incl. 2 jaarlijkse seizoensswitch (1 april/1mei en 1 november)	Uitgevoerd conform afspraken
2	Plaatsing paal Verklikkerplaat.	Zomer	Nog niet gerealiseerd.
3	Evaluatie ligging en effectiviteit markeringen rustgebieden.	December	Evaluatie is uitgevoerd op grond van ervaringen van RWS NZ - Markeringsdienst, toezichthouders en handhavers en enkele belangenorganisaties.

**Financiën:**

Bovenstaande activiteiten zijn uitgevoerd voor de totaalsom van EURO 30.000

**3.4 Monitoren (coördinatie Rijkswaterstaat Noordzee)**

Ten behoeve van de monitoring in het kader van Natura 2000 is grotendeels gebruik gemaakt van het uitgebreide monitoringsprogramma (in opdracht van Rijkswaterstaat) op grond van de natuurcompensatie Maasvlakte 2 (ecologie, abiotiek en gebruik) in het gebied. Daarnaast wordt meetinformatie ingewonnen van de reguliere landelijke Rijkswaterstaats-monitoring (ecologie en abiotiek MWTL). Het streven was om eind van het jaar een analyse te maken van tussentijdse meetresultaten en deze in de vorm van publieksinformatie te verspreiden (o.m. op de website). Dit mede op uitdrukkelijk verzoek van de belangenorganisaties (Maatschappelijk Overleg Voordelta). Dit is helaas niet gelukt. Reden: de vertraging in het gereedkomen van de rapportage van tussentijdse meetresultaten uit het monitoringsprogramma op grond van de natuurcompensatie Maasvlakte 2. Dit is thans voorzien in voorjaar 2010, een vertraging van drie maanden. Ingeschat wordt dat deze vertraging niet wordt ervaren als publieksonvriendelijk en niet nadelig is voor het bereikte draagvlak voor de beheerplanmaatregelen.

In 2009 heeft de door de provincie Zeeland georganiseerde 3-jaarlijkse (water)recreatie-telling in de Voordelta plaats gevonden. Tijdens deze tellingen worden de recreanten, ingedeeld naar gebruik, op het water en de aangrenzende stranden geteld. In totaal is er in de periode van 1 mei en 21 september 14 keer geteld, afwisselend tijdens hoog water en laag water en door de weeks en in het weekend. Voorafgaand aan de tellingen zijn de telformulieren en de indeling van de telgebieden zodanig aangepast dat maximale informatie uit de tellingen beschikbaar komt over het naleefgedrag van de ingestelde toegankelijkheidsregeling. De resultaten van de tellingen waren eind 2009 nog in bewerking.

De provincie Zeeland heeft in 2009 in totaal 9 specifieke zeehondentellingen van de rustgebieden uitgevoerd. Deze tellingen vormen een aanvulling op de Rijkswaterstaats-monitoring. De provinciale zeehondentellingen vallen tussen de Rijkswaterstaats-tellingen in, in de periode dat jonge zeehonden in het gebied worden verwacht. Hierbij gaat het om de periode december- februari (grijze zeehonden) en juni-juli (gewone zeehonden). De resultaten waren eind 2009 nog in bewerking. Het algemene beeld uit de tellingen is dat er sprake is van afdoende rust in de rustgebieden door een goed naleefgedrag.

**Tabel: producten en mijlpalen Monitoren Voordelta 2009:**

Product nr.	Omschrijving	Mijlpaal	Resultaat
1	Monitoring en Evaluatieprogramma Natuurcompensatie.	Juni	Gereedgekomen juli 2009.
2	Informatie over resultaten lopend ecologisch onderzoek.	December	Niet gerealiseerd wegens onvoldoende beschikbare publieksgerichte informatie. Gevolg is een voorlopig uitstel van de toegezegde informatie richting het publiek.
3	Tussentijdse evaluatie naleefgedrag maatregelen.	December	Is gereed, opgesteld in kader thema Toezicht en handhaving (zie punt 3.1).
4	Monitoring in kader suppleties.		Wordt meegenomen door RWS in kader landelijk suppletieprogramma (reguliere actie bij suppletiewerken).
5	Provinciale vliegtuigtellingen zeehonden deltaxwateren.	Juni-augustus en december-februari	Extra tellingen in de werptijd gewone (juni) en grijze (december) zeehonden zijn uitgevoerd (reguliere activiteit).
6	Provinciale vliegtuigtellingen (water)recreatie.	Mei-september	In 2009 heeft de 3-jaarlijkse provinciale recreatietelling plaats gevonden in de Voordelta.
7	Werkplan monitoring.	November	Is grotendeels gereedgekomen m.b.t. natuuraspecten (MWTL).

**Financiën:**

Bovenstaande activiteiten zijn uitgevoerd binnen de reguliere budgets van Rijkswaterstaat en provincie Zeeland.

**3.5 Vergunningverlening (coördinatie: provincie Zeeland)**

In 2009 zijn een 2-tal onderzoeken afgerond naar activiteiten die niet in het beheerplan Voordelta zijn opgenomen: extreme sporten op de stranden en evenementen.

De "Natuurtoets effecten van extreme sporten op de natuurwaarden van de Voordelta" laat onder meer zien dat geen significante negatieve effecten worden verwacht als gevolg van het kitebuggy'en op daarvoor door de gemeenten aangewezen locaties. Door de gemeente Schouwen-Duiveland is dan ook een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 aangevraagd voor de locatie op het Verklikkerstrand. De procedure liep eind 2009 nog.

De "Voortoets evenementen in/grenzend aan het Natura 2000-gebied Voordelta" geeft aan dat de bestaande evenementen, zoals aangereikt en beschreven door de gemeenten, (cumulatief) geen significante verstoring van soorten en geen verslechtering van habitats of habitatsoorten veroorzaken in relatie tot de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Voordelta. Deze evenementen kunnen, voor zover ze naar aard, tijd en omvang hetzelfde blijven, in de toekomst dan ook zonder vergunning doorgang blijven vinden. Aangekondigd is dat door GS Zeeland en GS Zuid-Holland het rapport, vergezeld van een bestuursbrief, aan de gemeenten toegezonden gaat worden. Dit zal begin 2010 plaats vinden.

In 2009 zijn vergunningen ex artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 afgegeven voor de winning van suppletiezand en het aanbrengen van suppletie bij Voorne, de vervanging/verplaatsing van een tweetal strandpaviljoens aan de Brouwersdam, de aanleg van een mountainbikeroute bij het Oostvoornse Meer, een strandgolftoernooi op het Verklikkerstrand en 5 vergunningen voor mechanische schelpdiervisserij (ensisvisserij, kokkelinventarisatie, oestervisserij).

In het kader van de 1-loket gedachte worden vergunningsaanvragen door LNV en de provincies Zeeland en Zuid-Holland om een zienswijze aan elkaar toegezonden. Ook wordt de zienswijze gevraagd van Rijkswaterstaat en de betreffende gemeente(n). Op deze wijze wordt afstemming gezocht in standpunten en zijn de bevoegde gezagen op de hoogte van initiatieven. De aanvragen worden getoetst aan het beheerplan Voordelta en uiteraard aan vigerende wetten en bepalingen.

**Tabel: producten en mijlpalen Vergunningverlening Voordelta 2009:**

<b>Product nr.</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Mijlpaal</b>	<b>Resultaat</b>
1	Bestuurlijke duidelijkheid vanuit provincies over wel/geen vergunningplicht in kader Nbw 1998 van evenementen en extreme sporten op en vanaf stranden.	Augustus	Onderzoeken zijn uitgevoerd. Vergunningaanvraag 'kitebuggy'en Verklikker-strand' is eind 2009 aangevraagd. Bestuurlijke brief 'evenementen' aan gemeenten wordt begin 2010 verzonden.
2	Werkwijze invulling '1-loketgedachte' voor vergunningverlening Nbw 1998 en registratiesysteem vergunningen.	November	Vergunningaanvragen worden door LNV, provincie Zeeland en de provincie Zuid-Holland om een zienswijze aan elkaar toegezonden, en afgestemd met Rijkswaterstaat en de betreffende gemeente(n).

**Financiën:**

Bovenstaande activiteiten zijn uitgevoerd binnen de reguliere budgets van Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland en provincie Zeeland.

**Bijlage:**

Leden en data Regiegroep Uitvoering Natura 2000-beheerplan Voordelta.

<b>Leden Regiegroep Voordelta 2009</b>		
Hans Lammers	RWS Noordzee	Lid, voorzitter
Rob Vransen	RWS Noordzee	Lid, secretaris
Bouke Bouwman	Provincie Zeeland	Lid
Coen Ladrak	Provincie Zuid-Holland	Lid
Cees Beekman	Provincie Zeeland	Plv. lid
Edwin Numan	Provincie Zuid-Holland	Plv. lid
Maartje van de Hulsbeek	Havenbedrijf Rotterdam	Agendalid
Jos Karssemeijer	LNV-DRZ-west	Agendalid
Ger Verschuren	LNV-DRZ-zuid	Agendalid

Data bijeenkomsten Regiegroep in 2009: 29/1, 16/4, 8/6 en 18/11.
